


資料5-2 工事範囲図(1階)

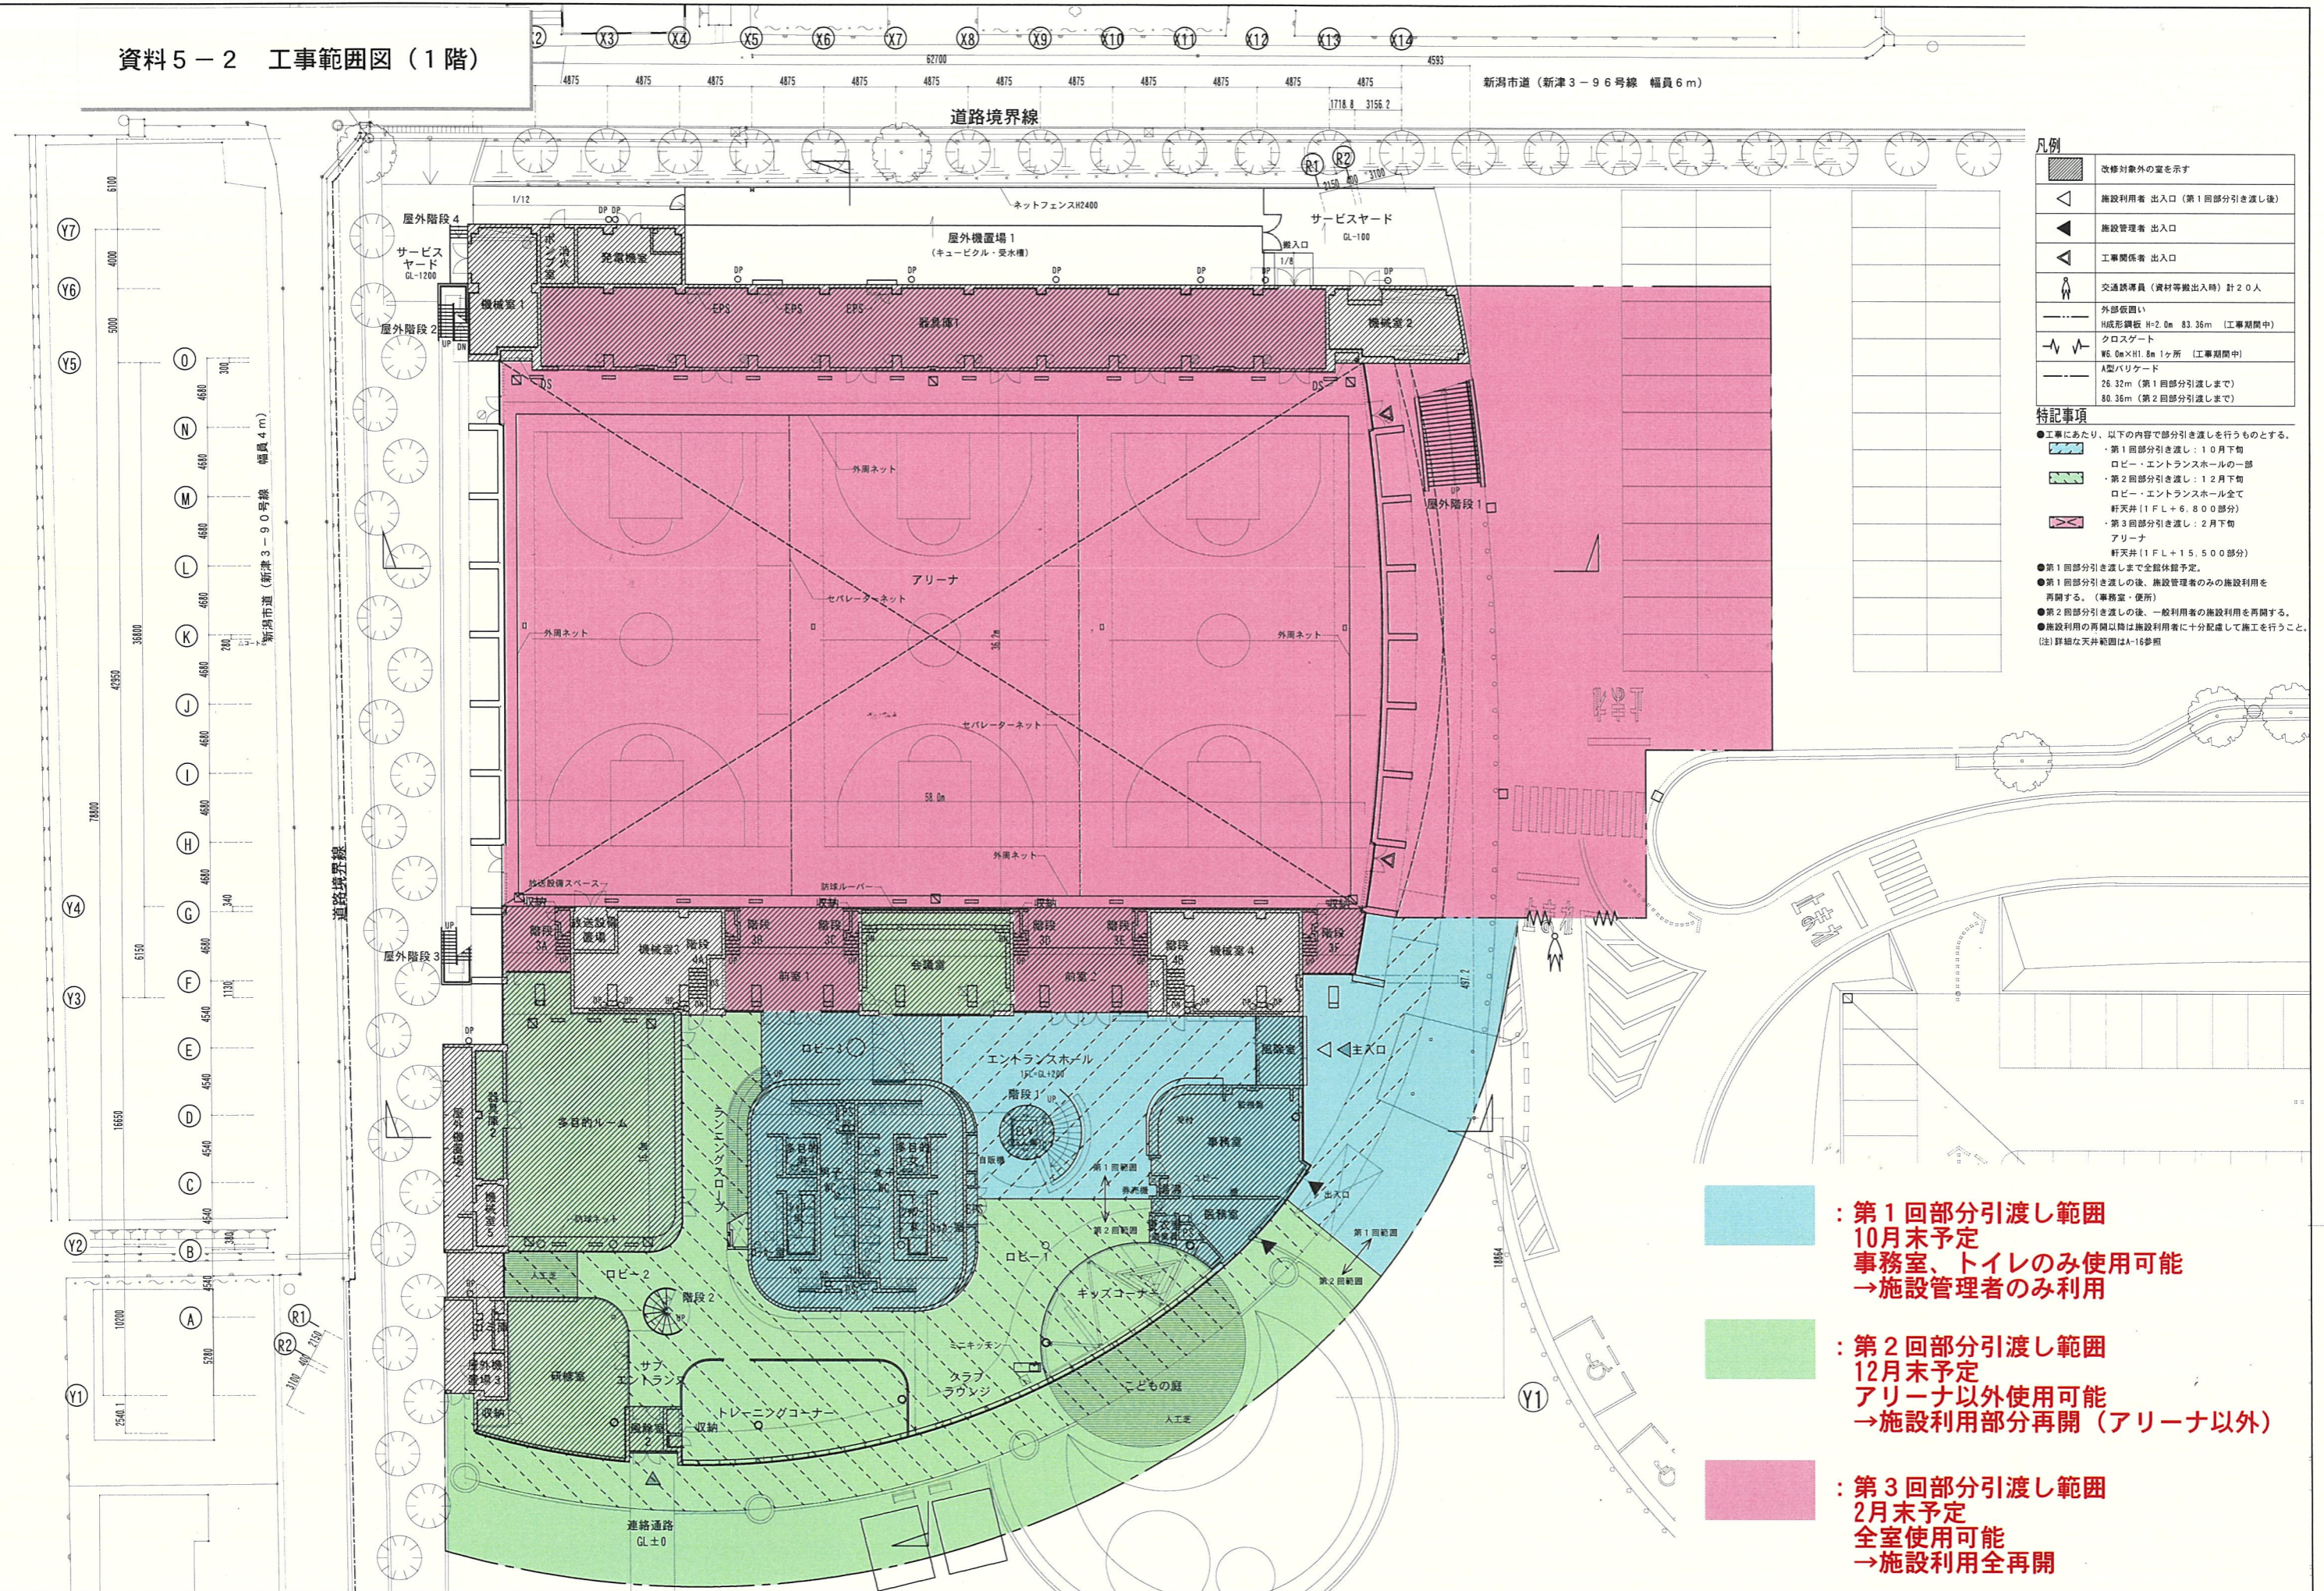

凡例

	改修対象外の室を示す
	施設利用者 出入口 (第1回部分引き渡し後)
	施設管理者 出入口
	工事関係者 出入口
	交通誘導員 (資材等搬出入時) 計20人
	外部仮囲い H成形鋼板 H=2.0m 83.36m (工事期間中)
	クロスゲート W6.0m×H1.8m 1ヶ所 (工事期間中)
	A型バリケード 26.32m (第1回部分引き渡しまで) 80.36m (第2回部分引き渡しまで)

- 特記事項
- 工事にあたり、以下の内容で部分引き渡しを行うものとする。
    - ・第1回部分引き渡し：10月下旬  
ロビー・エントランスホールの一部
    - ・第2回部分引き渡し：12月下旬  
ロビー・エントランスホール全て  
軒天井 (1FL+6.800部分)
    - ・第3回部分引き渡し：2月下旬  
アリーナ  
軒天井 (1FL+15.500部分)
  - 第1回部分引き渡しまで全館休館予定。
  - 第1回部分引き渡しの後、施設管理者のみの施設利用を再開する。(事務室・便所)
  - 第2回部分引き渡しの後、一般利用者の施設利用を再開する。
  - 施設利用の再開以降は施設利用者に十分配慮して施工を行うこと。
- (注) 詳細な天井範囲はA-16参照

- : 第1回部分引渡し範囲  
10月末予定  
事務室、トイレのみ使用可能  
→施設管理者のみ利用
- : 第2回部分引渡し範囲  
12月末予定  
アリーナ以外使用可能  
→施設利用部分再開 (アリーナ以外)
- : 第3回部分引渡し範囲  
2月末予定  
全室使用可能  
→施設利用全再開

株式会社 鈴木設計企画  
管理建築士 一級建築士登録第84168号 鈴木 正二

新潟市建築部公共建築第2課

工事名 秋葉区総合体育館特定天井改修 工事

図名 仮設計画図  
年月日 2021.05 縮尺 1:200 図面番号 A-07
